



COMUNE di SAN MANGO D'AQUINO

Provincia di Catanzaro

Progetto esecutivo

Sistemazione e messa in sicurezza viabilità interna e spazi pubblici attrezzati

	Elaborato	
Tav. E.07	Cronoprogramma delle opere	

Committente

Comune di San Mango d'Aquino

Impresa Appaltatrice

Progettisti

Progettisti

Dott. Ing. Francesco COSTANZO

Dott. Ing. Basilio MAZZEI

Dott. Arch. Marcello MAZZA

Direttore dei lavori

Dott. Ing. Francesco COSTANZO

Dott. Ing. Basilio MAZZEI

Dott. Arch. Marcello MAZZA

Geom. Pasquale COSTANZO

Responsabile del Procedimento

Geom. Franco TORCHIA

Coordinatore della Sicurezza

Geom. Pasquale COSTANZO

Data

ottobre 2015

Aggiornamento

Aggiornamento

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino

Lavori a base d'asta: 113.484,12 € oltre IVA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.265,88 € oltre IVA.

- Considerato che la produzione media mensile di un'impresa di modeste dimensioni varia tra 50000 e 100000 euro;
- Tenuto conto della tipologia dei lavori e delle forniture e che la maggior parte di essi si svolge in ambiente chiuso;
- Ritenendo in via presuntiva che il verbale di consegna possa essere redatto in data 22/02/2016;

il programma dei lavori risulta determinato come segue:

CONSEGNA DEI LAVORI: 22/02/2016;

INIZIO DEI LAVORI: 22/02/2016;

PRODUZIONE


	euro	%
22/02-21/03	40 000,00	35,24
22/03-21/04	40 000,00	35,24
22/04-21/05	33 484,12	29,52

Pertanto il tempo utile per dare ultimati i lavori, mettendo in conto eventuali imprevisti, viene determinato in **90 giorni** solari consecutivi dalla data di consegna dei lavori. La stazione appaltante, considerato che le sequenze delle produzioni convenzionali mensili siano strettamente legate alla data in cui viene effettivamente redatto il verbale di consegna, si riserva espressamente la facoltà di mettere a punto il programma definitivo dei lavori in sede di redazione di detto verbale allorché alla data di quest'ultimo non coincida con quella indicata in via presuntiva. Conseguentemente la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di ridefinire, qualora lo ritenesse opportuno, in sede di consegna, il tempo utile contrattuale.

I Progettisti

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Torchia

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	22/02/2016	22/02/2016	0
2	B	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	22/02/2016	23/02/2016	1
3	C.1	Scavo di sbancamento	23/02/2016	25/02/2016	2
4	C.2	Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	25/02/2016	26/02/2016	1
5	C.3	Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	26/02/2016	02/03/2016	5
6	C.4	Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	02/03/2016	04/03/2016	2
7	C.5	Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	04/03/2016	06/03/2016	2
8	C.6	Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	06/03/2016	13/03/2016	7
9	C.7	Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	13/03/2016	18/03/2016	5
10	C.8	Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	18/03/2016	19/03/2016	1
11	C.9	Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	19/03/2016	30/03/2016	11
12	C.10	Montaggio di arcarecci in legno lamellare	30/03/2016	02/04/2016	3
13	C.11	Montaggio di tavolame in legno lamellare	02/04/2016	08/04/2016	6
14	C.12	Impermeabilizzazione di coperture	08/04/2016	14/04/2016	6
15	C.13	Posa di manto di copertura in tegole bituminose	14/04/2016	17/04/2016	3
16	C.14	Realizzazione di opere di lattoneria	17/04/2016	18/04/2016	1
17	C.15	Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	18/04/2016	02/05/2016	14
18	C.16	Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	02/05/2016	06/05/2016	4
19	C.17	Posa di pavimenti per esterni in masselli	06/05/2016	08/05/2016	2
20	C.18	Formazione di fondazione stradale	08/05/2016	14/05/2016	6
21	C.19	Formazione di manto di usura e collegamento	14/05/2016	21/05/2016	7
22	D	Smobilizzo del cantiere	21/05/2016	22/05/2016	1

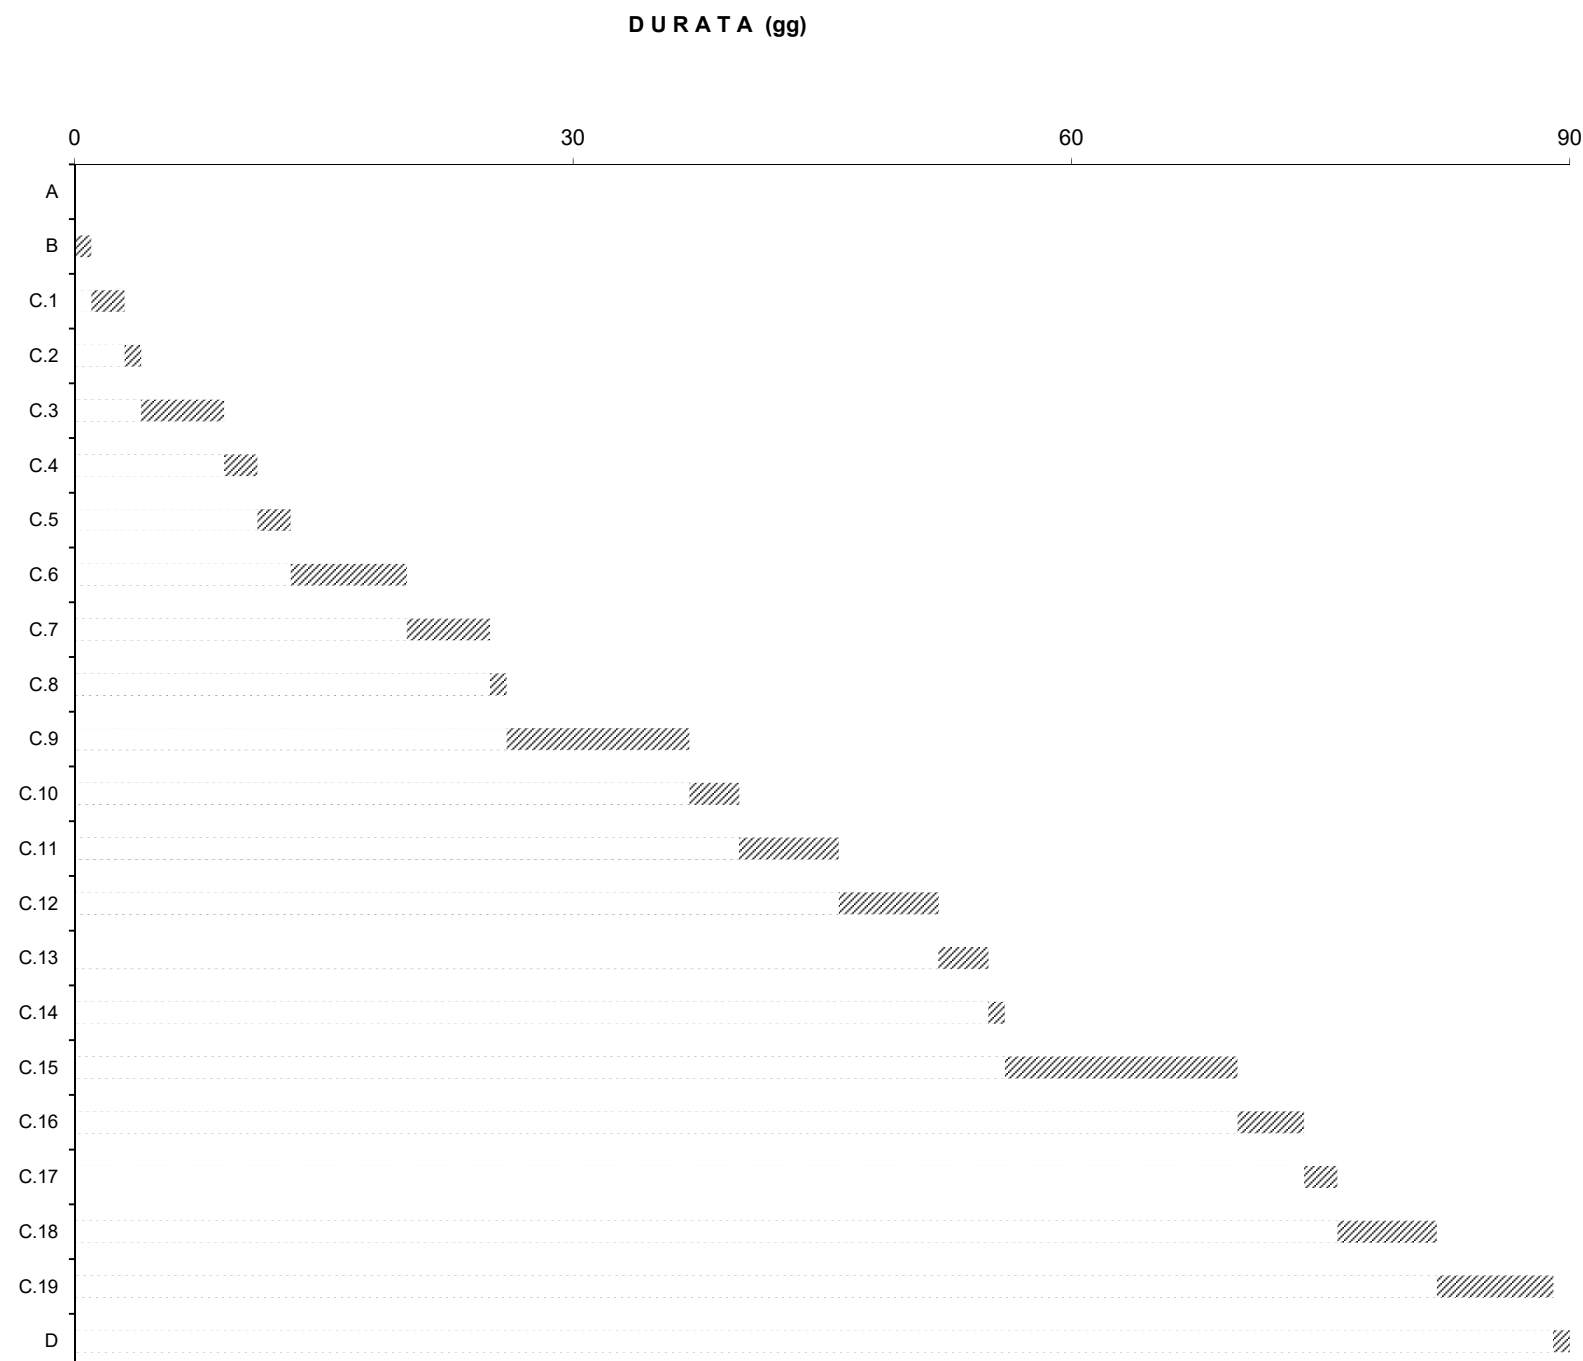

TC

90

gg.

naturali consecutivi
